

4° seminario ECMS, 14 dicembre 2023 - Agenda

Seminario informativo sul progetto ECMS – 14 dicembre 2023

		Agenda	Relatori
10:00	10:10	Introduzione	Luca Rissolo
10:10	10:45	La nuova pianificazione del progetto	Maria Costantini
10:45 11:00	11:00 11:15	Aggiornamenti su attività di test in corso – la movimentazione titoli e altre funzionalità – i prestiti bancari	Michele Zaccagnino Antonio Toma
11:15	11:30	La migrazione a ECMS: - prossimi test - connessione in prod e registration form	Alessandro Intonti
11:30	11:45	<i>Coffee break</i>	
11:45	12:15	I manuali operativi della GUI – esempi (moduli ECMS, monitoraggio notifiche di movimentazione titoli)	Piero Mestici Maria Pernisco
12:15	12:30	<i>Euronext Securities Milan</i> – test Score e coordinamento con test ECMS	Paolo Pacei
12:30	13:00	Domande e risposte	





ECMS: la riplanificazione del progetto



Seminario ECMS - 14 dicembre 2023

Maria Costantini
Banca d'Italia
Servizio Sistema dei pagamenti



La nuova pianificazione 1/3

High-level User Testing and Migration plan

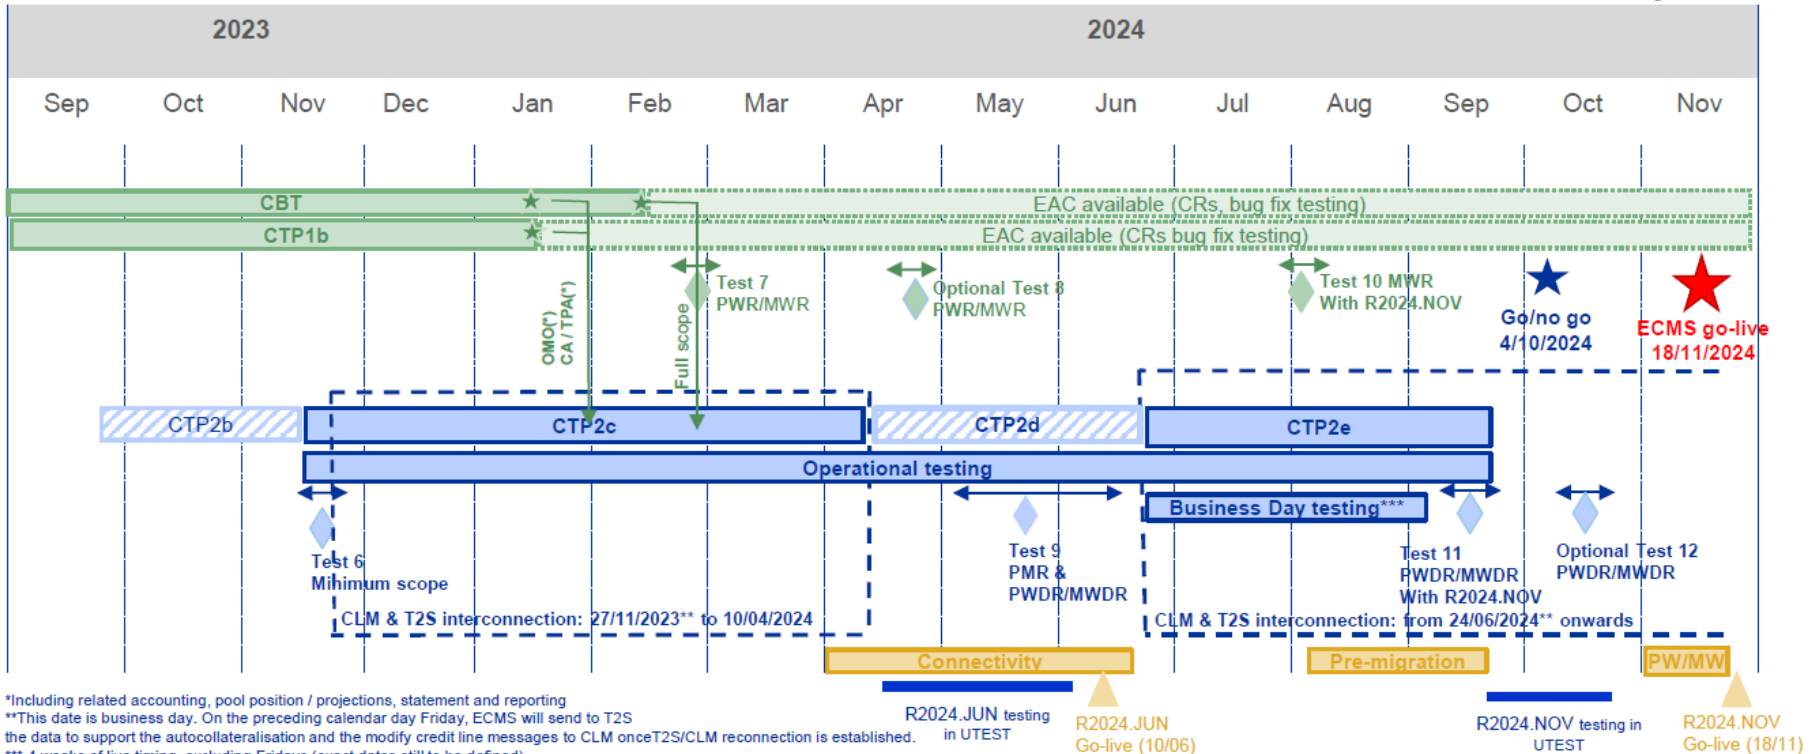

*Including related accounting, pool position / projections, statement and reporting

**This date is business day. On the preceding calendar day Friday, ECMS will send to T2S the data to support the autocollateralisation and the modify credit line messages to CLM once T2S/CLM reconnection is established.

*** 4 weeks of live timing, excluding Fridays (exact dates still to be defined)

The duration of User Testing phases (Central Bank Testing, Community testing phases 1 and 2, Business day and Operational testing) includes time needed to execute migration testing.

The ECMS Pre-Prod environment remains available for testing after the end of CTP2e for elements noncritical for decision to go live.



La nuova pianificazione 3/3

Nella riunione del 29 novembre il Consiglio Direttivo della BCE ha posticipato la data di avvio del progetto ECMS dall'8 aprile 2024 al **18 novembre 2024**

La decisione del Consiglio Direttivo è stata adottata sulla base dell'assessment del comitato competente *Market Infrastructure Board* (MIB): insufficiente stabilità del software, necessità degli utenti di disporre di un adeguato periodo di tempo per l'esecuzione dei collaudi in un ambiente stabile.

Il MIB ha definito le misure per affrontare i problemi riscontrati e farà uno stretto monitoraggio del progetto.

La pianificazione di dettaglio è in corso di approvazione, i principali elementi sono i seguenti:

- definizione di **due milestones** per il rilascio delle funzionalità in pre-prod:
 - **29 gennaio 2024** → corporate actions (CA), Open Market Operations (OMO) / Triparty (TPA)
 - **26 febbraio 2024** → rilascio di tutte le funzionalità, eccetto alcune CR (es CA Standard release 2024)
- **rilasci bisettimanali** delle modifiche software per bug fix
- esteso periodo di **interconnessione tra ECMS-T2S-CLM** che consentirà di svolgere i test in condizioni simili alla produzione (circa 8 mesi)
- **4 settimane di live-timing** nella fase CTP2e, escluso il venerdì, date da definire
- **4/10/2024** go/no-go decision del comitato MIB



La nuova pianificazione 2/3

Service	ECMS interconnection in EAC	ECMS interconnection in Pre-Prod
T2S	16 January 2023 onwards	Three slots: <ol style="list-style-type: none"> 03 July 2023 to 20 September 2023 27 November 2023* to 10 April 2024 24 June 2024* onwards
CLM	16 January 2023 onwards	Three slots: <ol style="list-style-type: none"> 03 July 2023 to 20 September 2023 27 November 2023* to 10 April 2024 24 June 2024* onwards

*This date is business day. On the preceding calendar day Friday, ECMS will send to T2S the data to support the autocollateralisation and the modify credit line messages to CLM once T2S/CLM reconnection is established.



La nuova pianificazione 4/3

La Banca d'Italia coordinerà, in particolare, l'esecuzione dei test più complessi:

- **REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA**, nell'ambito delle campagne di test end-to-end coordinate dalla BCE, indicativamente a partire **da febbraio/marzo 2024**
- **CORPORATE ACTIONS**
 - in corso di valutazione, con *Euronext Securities Milan*, la fattibilità di una prima fase di test nella fase CTP2c (**marzo-aprile 2024**) per le CA più semplici (INTR, REDM)
 - la campagna di test completi delle CA sarà avviata con l'inizio della fase CTP2e (da fine giugno 2024)
- **POOL per ASSEGNI CIRCOLARI**: alimentazione dell'importo da garantire tramite la funzionalità del credit freezing
- **TARIFFAZIONE MENSILE** custodia titoli

Reporting sui test eseguiti:

- prossima rilevazione con **cut-off 20 dicembre**, tramite la compilazione di un questionario excel da restituire entro il 22/12 (% di esecuzione con esito positivo dei FTC)
- i test eseguiti durante la fase 2b (disconnessione dei Target Services) non devono essere conteggiati
- le successive rilevazioni avranno frequenza mensile



La nuova pianificazione ECMS – calendario seminari 2024

- **La Banca d'Italia** prevede di organizzare i seguenti incontri con le banche:
 - fine gennaio/febbraio – seminario tematico per l'illustrazione delle modalità di esecuzione dei test sulle operazioni di politica monetaria
 - fine febbraio/marzo – seminario tematico gestione prestiti e corporate actions
 - giugno/luglio – seminario per aggiornamenti e illustrazione modifiche ai contratti
 - ottobre – seminario in vista della migrazione in produzione
- **La BCE** organizzerà una Focus session su ECMS nel Q1 2024



Grazie per l'attenzione.

