



ECMS: aggiornamento sullo stato del progetto

Seminario ECMS - 16 dicembre 2022

Maria Costantini
Banca d'Italia
Servizio Sistema dei Pagamenti



Ripianificazione ECMS


Background:

- il 20 ottobre 2022 il Consiglio Direttivo della BCE ha posticipato l'avvio del progetto T2-T2S Consolidation (CSLD) dal 20 novembre 2022 al 20 marzo 2023
 - data l'interdipendenza tra i progetti CSLD e ECMS, l'Eurosistema ha avviato tempestivamente una rilevazione dell'impatto del posticipo di CSLD su ECMS in termini di risorse sia presso le BCN sia nella comunità finanziaria
 - per il mercato italiano è risultato un impatto Yellow*, per gli altri mercati europei risultati tra Yellow e Red
 - Il 2 dicembre 2023 la BCE ha comunicato la decisione di posticipare l'avvio di ECMS **all'8 aprile 2024**
- Yellow: impatto medio, parziale sovrapposizione di risorse tra i due progetti ma comunque gestibile con maggiore effort,
 - Red: impatto rilevante, le risorse dedicate a CSLD non potranno essere riallocate al progetto ECMS



ECMS - Pianificazione in corso di revisione

High-level planning overview

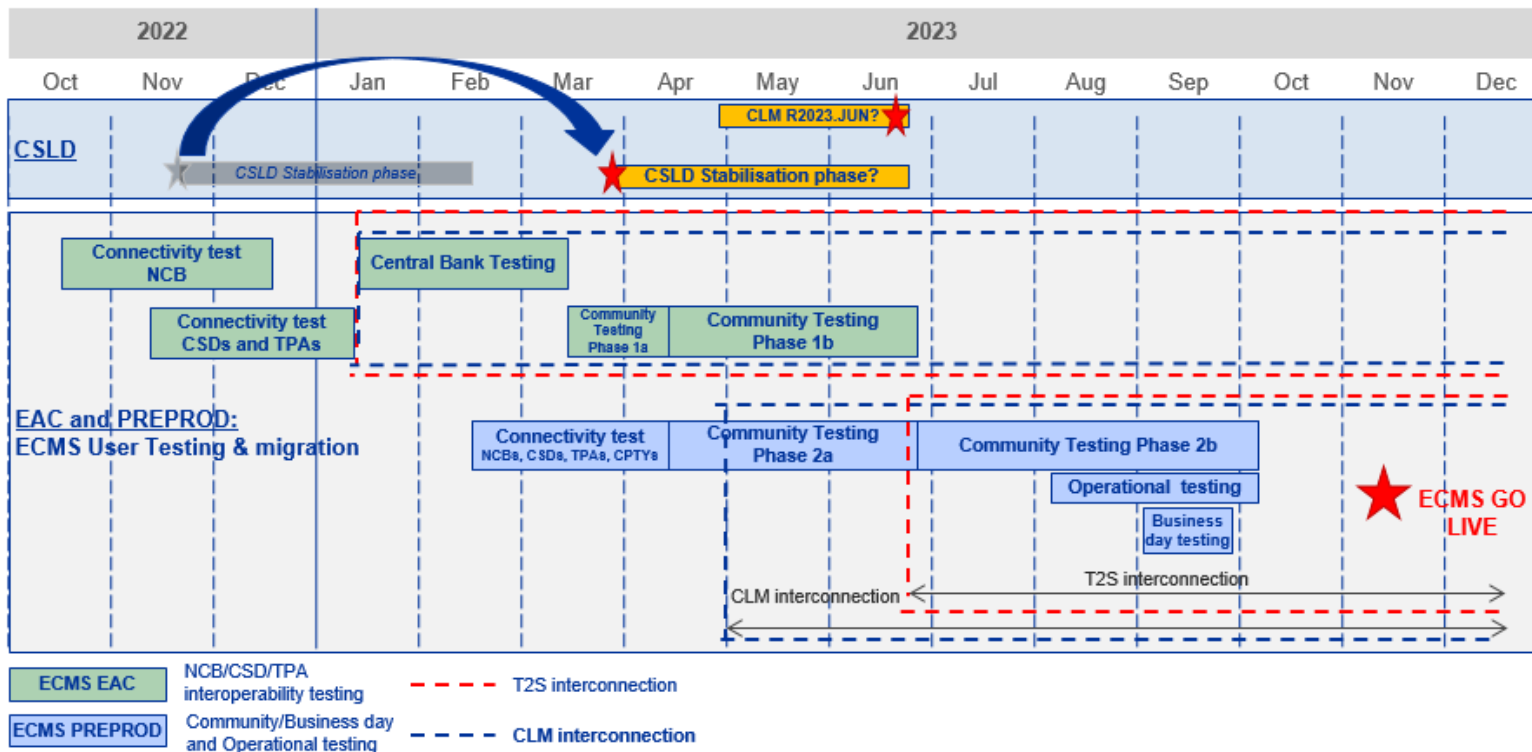

Next steps

aggiornata in base a comunicazioni BCE del 19/12/2022

- La nuova pianificazione del progetto è attesa per fine gennaio 2023
- Fino all'approvazione della nuova pianificazione, occorre quindi procedere secondo la pianificazione attuale
- La Banca d'Italia distribuirà alle banche i Registration form a breve affinché siano consegnati compilati entro fine gennaio 2023 (termine soggetto a possibile modifica) - **BdI distribuirà i RF entro il 20 gennaio 2023 e comunicherà la data di restituzione**
- Il successivo step per le banche è l'avvio dei test di connettività attualmente previsti dal 20 febbraio al 15 aprile 2023 (date soggette a possibile modifica)
- L'avvio della fase dei test funzionali è attualmente previsto per il 17 aprile 2023. (data soggetta a possibile modifica)



Aggiornamenti della documentazione (1)

Durante la fase progettuale di ECMS sono emerse varie esigenze di modifica dei requisiti inizialmente previsti (Change requests, CRs).

Alcune CRs sono state già realizzate, altre saranno realizzate per il go-live di ECMS; tra queste rilevano:

- l'adeguamento di ECMS ad alcuni Standard SCoRE definiti a ottobre e dicembre 2021 (mentre lo scope di ECMS era stato definito sulla base della prima versione degli Standard Score di dicembre 2019), ad eccezione dei processi sui meeting event (vedi appendice);
- l'adeguamento di ECMS, su richiesta di alcuni CSD, per la messaggistica sulle Corporate Actions alle Standard Releases della SWIFT del 2022 e del 2023 (mentre ECMS è sviluppato sulla base della SR 2019);
- l'adeguamento del messaggio di estratto conto (semt.002), usato in ECMS per titoli e prestiti, alla nuova versione T2S rilasciata in produzione a novembre 2022

Tutto ciò determinerà l'aggiornamento in due step della documentazione di ECMS



Aggiornamenti della documentazione (2)

- Aggiornamento in **MyStandards**
 - *non-binding messages*: dicembre 2022 e aprile 2023
 - Binding messages : gennaio e maggio 2023
- Il **Catalogue of Messages** verrà pubblicato sul sito della BCE in concomitanza con le due pubblicazioni dei binding messages
- è in corso di analisi una modifica sui «Credit Claims file» per introdurre la paginazione

Title	Delivery of non-binding XSDs (MYSTANDARDS)	Delivery of binding XSDs
semt.002 - Statement of holdings	2 December 2022	30 January 2023
camt.077 Billing Report message (camt.077) per CSD/TPA	2 December 2022	30 January 2023
Alignment to SCoRE for Corporate actions and SR 2022 (messaggi seev.xxx) *	2 December 2022	30 January 2023
Upgrade of meeting announcement and corporate action messages to SR 2023 (seev.xxx)	28 April 2023	29 May 2023

* L'eventuale impatto di queste modifiche sul messaggio camt.077 che le banche ricevono dal modulo di BILL dovrà essere gestito nell'ambito del change management del modulo BILL.




Aggiornamenti della documentazione (3)

- A gennaio 2023 sarà pubblicata la *GUI for counterparties* che illustrerà le modalità per l'interazione U2A con ECMS;
- in prossimità dell'avvio dei test di connectivity Banca d'Italia predisporrà una guida sulle attività da svolgere tramite la GUI per il set-up degli utenti
- Le banche sono invitate a fornire feedback sulla prima versione della Guida ECMS; prima dell'avvio dei test di community verrà predisposta una versione aggiornata



ECMS Readiness e training

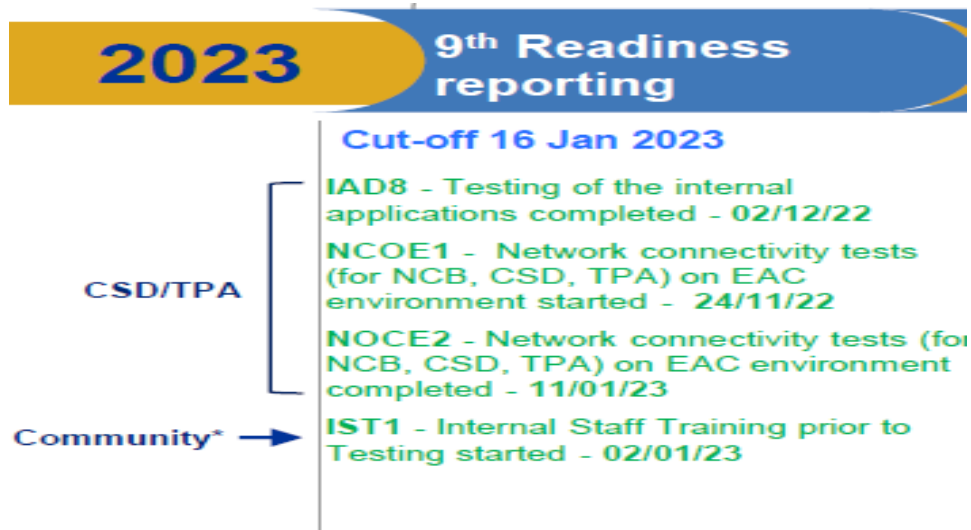

- Il prossimo questionario sulla readiness dovrebbe rilevare la milestone **IST1 Internal Staff Training prior to Testing started** al 2/1/2023. E' in corso la valutazione se posticipare e/o non procedere alla rilevazione di questa milestone in attesa della nuova pianificazione
- In ogni caso, il **training delle risorse interne** delle banche può essere effettuato sulla base del materiale illustrato/distribuito:
 - Seminario Banca d'Italia 22 giugno 2021 sugli aspetti funzionali
 - ECB Focus session 20 giugno 2022 – connectivity, readiness, testing&migration
 - Guida ECMS per controparti vers. 0.1
 - Seminario Banca d'Italia 12 dicembre 2022 – configurazioni, testig&migration, Registration form



**Grazie per
l'attenzione**



Appendice (tratta da presentazione all'AmiSeco di luglio 2022)

MIB decisions related to CA and meeting messages

- As part of the ECMS go-live scope stabilisation process, and bearing the market request to adopt latest message versions in mind, the MIB has decided, in respect of the SCoRE Corporate Actions (CA) Rulebook, to approve the implementation of 37 of the 39 CA/meeting events.*
- The remaining 2 events, bondholder meeting (BMET) and court meeting (CMET), will be fully deployed as soon as possible in a post go-live ECMS release.
- For the interim period, meeting announcements will still be received by the ECMS (seev.001), but the Eurosystem will take no further action. As any assets affected by the meeting announcement will be temporarily demobilised, there will be no need for CSD to send or receive any further meeting-related messages.

* For the timing of the implementation of specific messages, see Annex 1



Appendice

Annex 1: Timing of implementation of messages

The meeting announcement notification and all corporate action messages will be implemented for the **ECMS go-live**.

The latest version of the remaining meeting messages will be implemented in the **next possible ECMS release***

seev.001	MeetingNotification
seev.031	CorporateActionNotification
seev.032	CorporateActionEventProcessingStatusAdvice
seev.033	CorporateActionInstruction
seev.034	CorporateActionInstructionStatusAdvice
seev.035	CorporateActionMovementPreliminaryAdvice
seev.036	CorporateActionMovementConfirmation
seev.037	CorporateActionMovementReversalAdvice
seev.039	CorporateActionCancellationAdvice
seev.040	CorporateActionInstructionCancellationRequest
seev.041	CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice
seev.042	CorporateActionInstructionStatementReport
seev.044	CorporateActionMovementPreliminaryAdviceCancellationAdvice

seev.002	MeetingCancellation
seev.003	MeetingEntitlementNotification
seev.004	MeetingInstruction
seev.005	MeetingInstructionCancellationRequest
seev.006	MeetingInstructionStatus
seev.007	MeetingVoteExecutionConfirmation
seev.008	MeetingResultDissemination

* Subject to a future MIB release scoping decision

