




# ECMS: pianificazione, milestones e readiness

**Seminario banche**  
**22 giugno 2021**

**Maria Costantini**  
**Banca d'Italia**  
*Servizio Sistema dei Pagamenti*



# ECMS overview

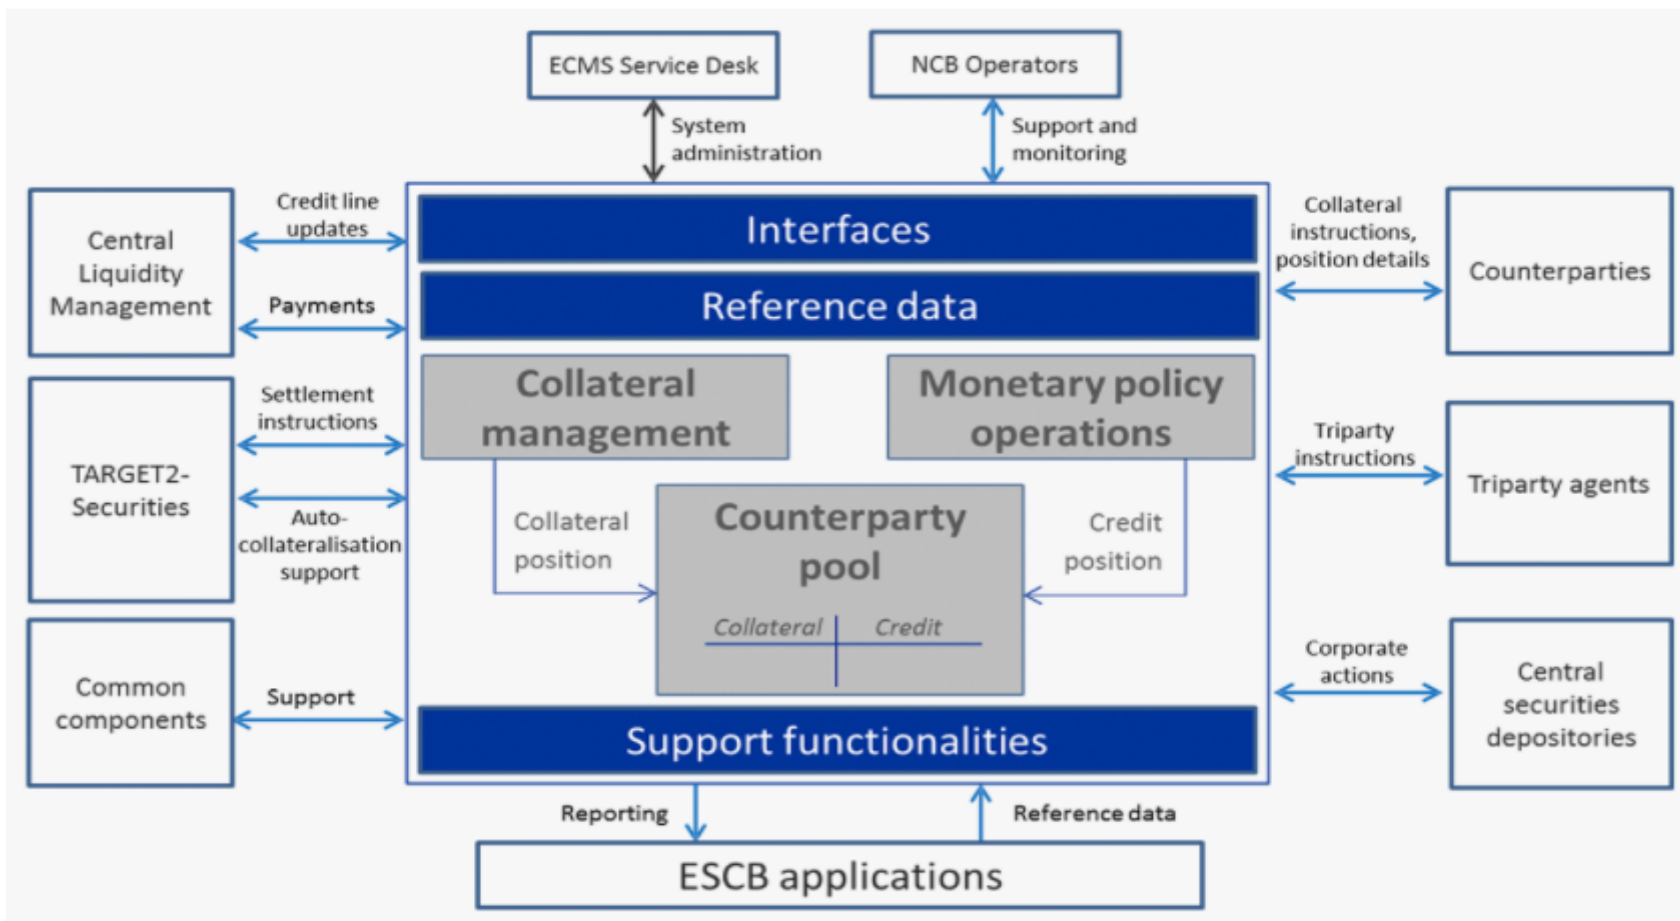

## ECMS – gli attori

- ❑ Le **banche centrali** - ruolo delle BCN sarà del tutto analogo a quello oggi svolto nei confronti della rispettiva comunità bancaria (rapporti contrattuali, tavolo operativo)
- ❑ Le **controparti**:
  - controparti di politica monetaria
  - soggetti abilitati all'utilizzo della liquidità infragiornaliera in CLM
  - banche soggette all'obbligo di versamento collaterale per assegni circolari
  - soggetti che versano collaterale a garanzia di storni SDD
- ❑ la **piattaforma TARGET2-Securities (T2S)** – per il regolamento delle operazioni di trasferimento delle garanzie in titoli e la gestione delle attività connesse alle operazioni di *autocollateral* (*invio dei dati e relocation of collateral*); ECMS si configura come DCP
- ❑ il **Modulo Central Liquidity Management (CLM)** – variazioni della linea di credito, regolamento operazioni di politica monetaria, cash collaterale, delle *corporate actions* e per l'addebito delle tariffe;
- ❑ i **Central Securities Depositories (CSD)** – per la gestione delle *corporate actions* relative alle garanzie in titoli;
- ❑ i **TriParty Agent (TPA)** - per la gestione delle garanzie tramite servizi *triparty*.
- ❑ i **Common components dei Target Services** (billing, CRDM, ESMIG) e altre infrastrutture dell'Eurosistema che gestiscono prezzi, titoli stanziabili, close links, ecc...




## La ripianificazione del progetto ECMS

- ❑ **20 novembre 2023:** nuova data di avvio del progetto ECMS
- ❑ Fattori che hanno influito sulla ripianificazione
  - interdipendenza con il progetto T2-T2S Consolidation slittato da novembre 2021 a novembre 2022
  - esigenza di preservare un adeguato period di test, senza sovrapposizioni con il period di test del progetto T2-T2S Conslidation
  - Ulteriori vincoli derivanti dalla gestione delle release di T2S per l'individuazione delle fasi di test
- ❑ La ripianificazione di un anno è andata a beneficio delle attività di analisi, sviluppo e test interni, mentre non è cambiata la durata del periodo di test degli utenti (banche centrali, CSD, TPA, banche)




# ECMS – la nuova pianificazione

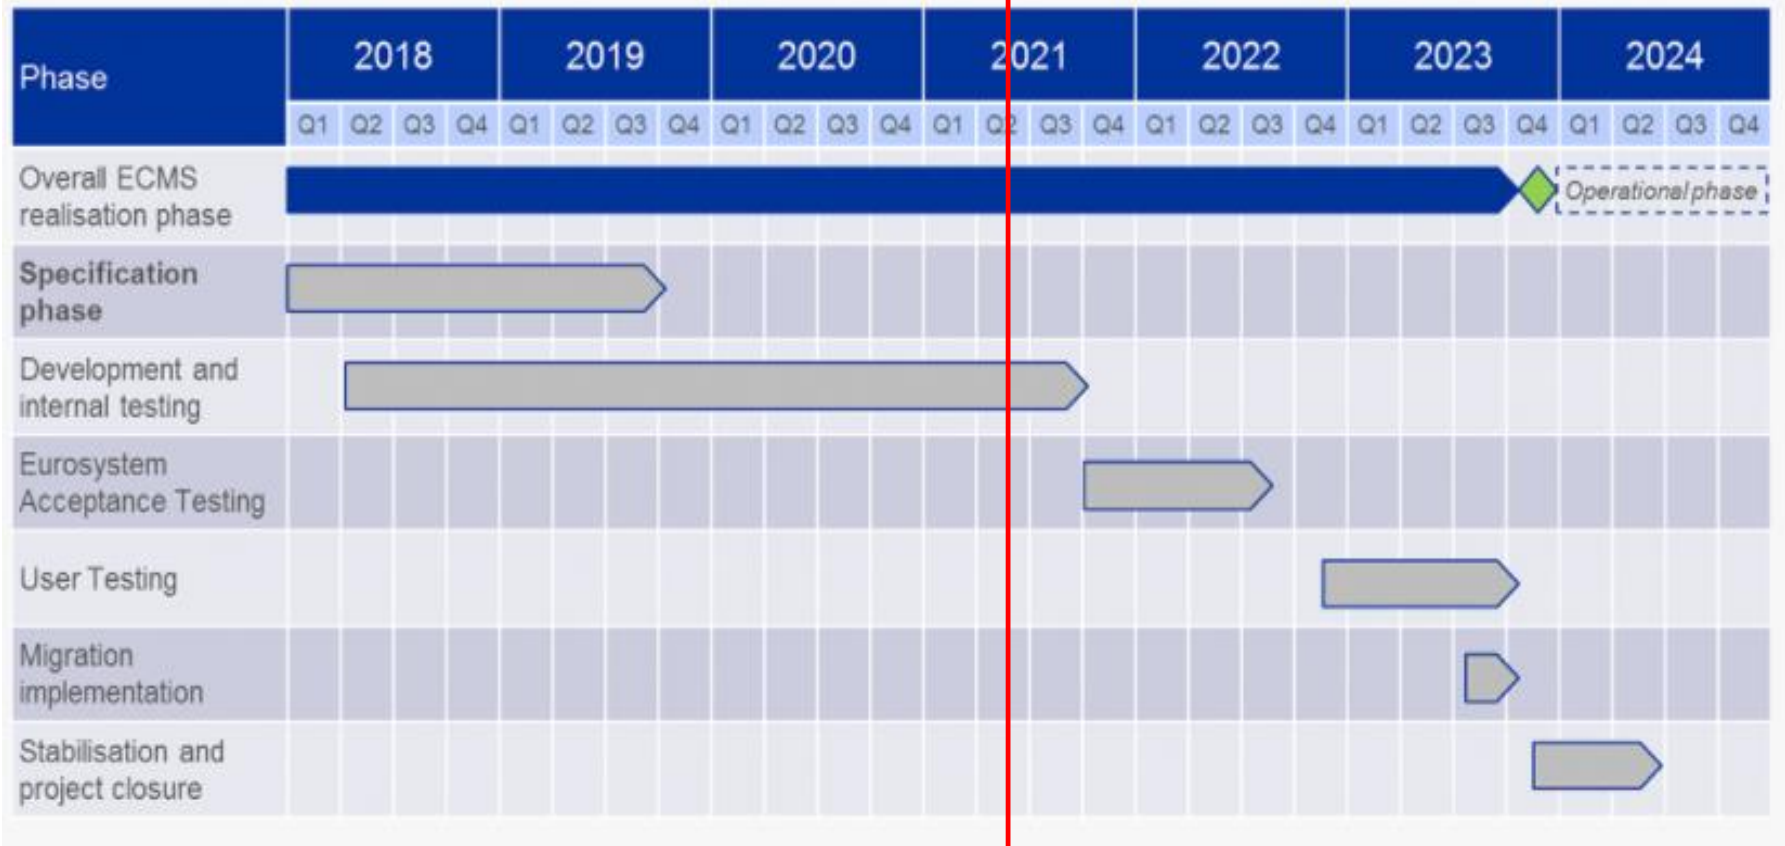

 siamo qui



# La readiness: migrazione con approccio big-bang




## ECMS – il monitoraggio della readiness

- ❑ ECMS sarà avviato in produzione adottando un approccio “big-bang”
- ❑ Il monitoraggio della readiness di tutti gli attori (banche centrali, banche, CSD e TPA) si configura come una misura di mitigazione del rischio di migrazione derivante dall’adozione di questo approccio
- ❑ La readiness viene valutata con riferimento alle milestones ossia date entro le quali devono poste in essere le attività tipiche di un progetto
- ❑ Obiettivi del monitoraggio della readiness
  - Coordinare, supportare e monitorare le attività relative alle modifiche tecniche, legali, di business e operative degli attori coinvolti.
  - Assicurare la compliance con le milestones intermedie
  - Alimentare lo scambio di informazioni
  - Identificare tempestivamente rischi e problematiche




# ECMS – le principali milestones per le controparti

**“ECMS project key milestones to ensure a successful big-bang migration in November 2023”** pubblicato ad aprile 2021 sul sito della BCE, descrive tutte le milestone di inizio e fine attività, incluse le attività migrazione, adeguamenti contrattuali e training  
[https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms210519\\_ECMS\\_key\\_milestones\\_detailed\\_description.en.pdf?8b568cd7acddf60005a05613d8941dcf](https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms210519_ECMS_key_milestones_detailed_description.en.pdf?8b568cd7acddf60005a05613d8941dcf)

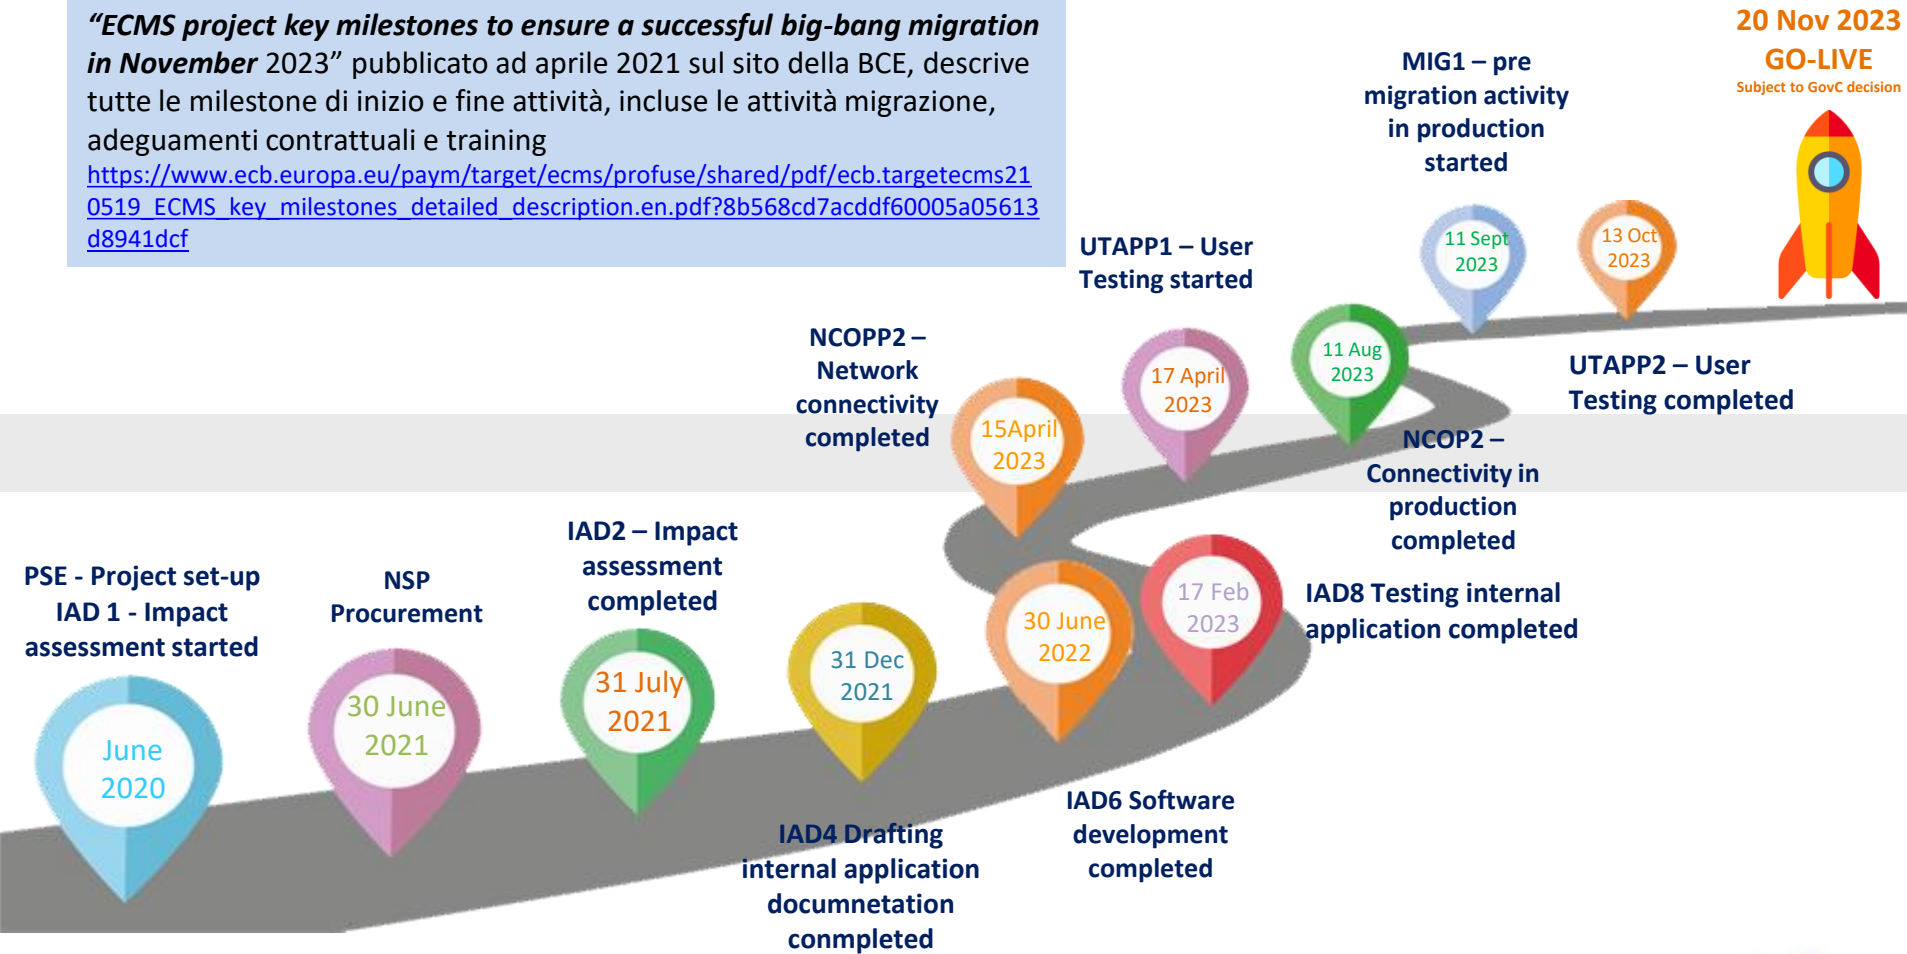




## ECMS - le milestones della readiness (I)

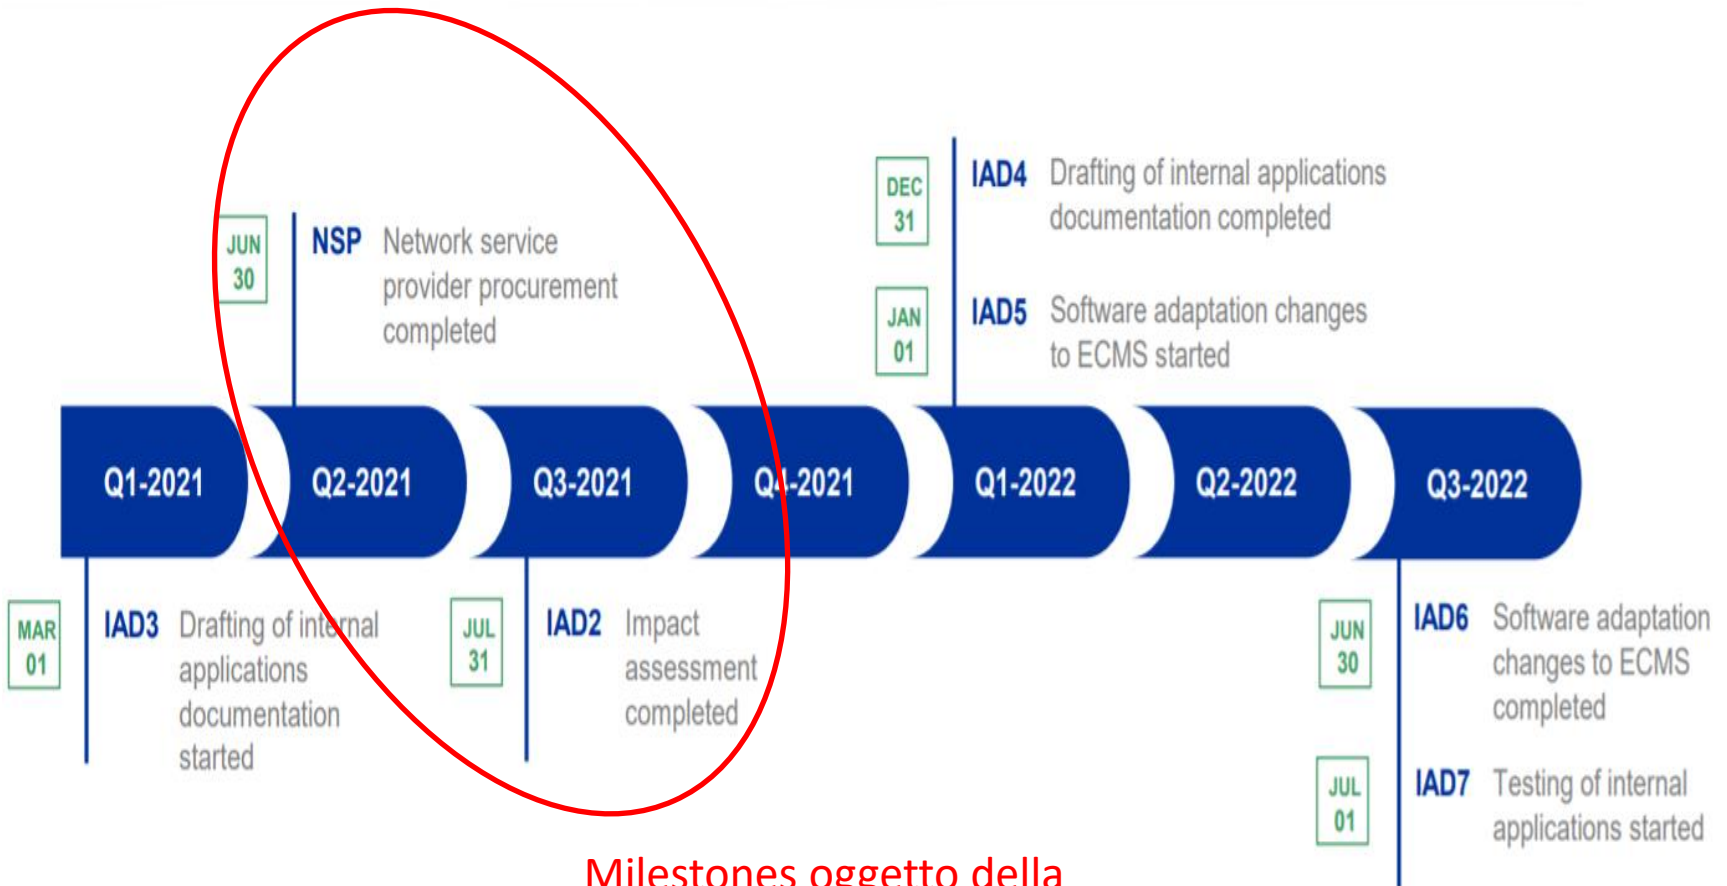

Milestones oggetto della prossima rilevazione



## ECMS - le milestones della readiness (II)

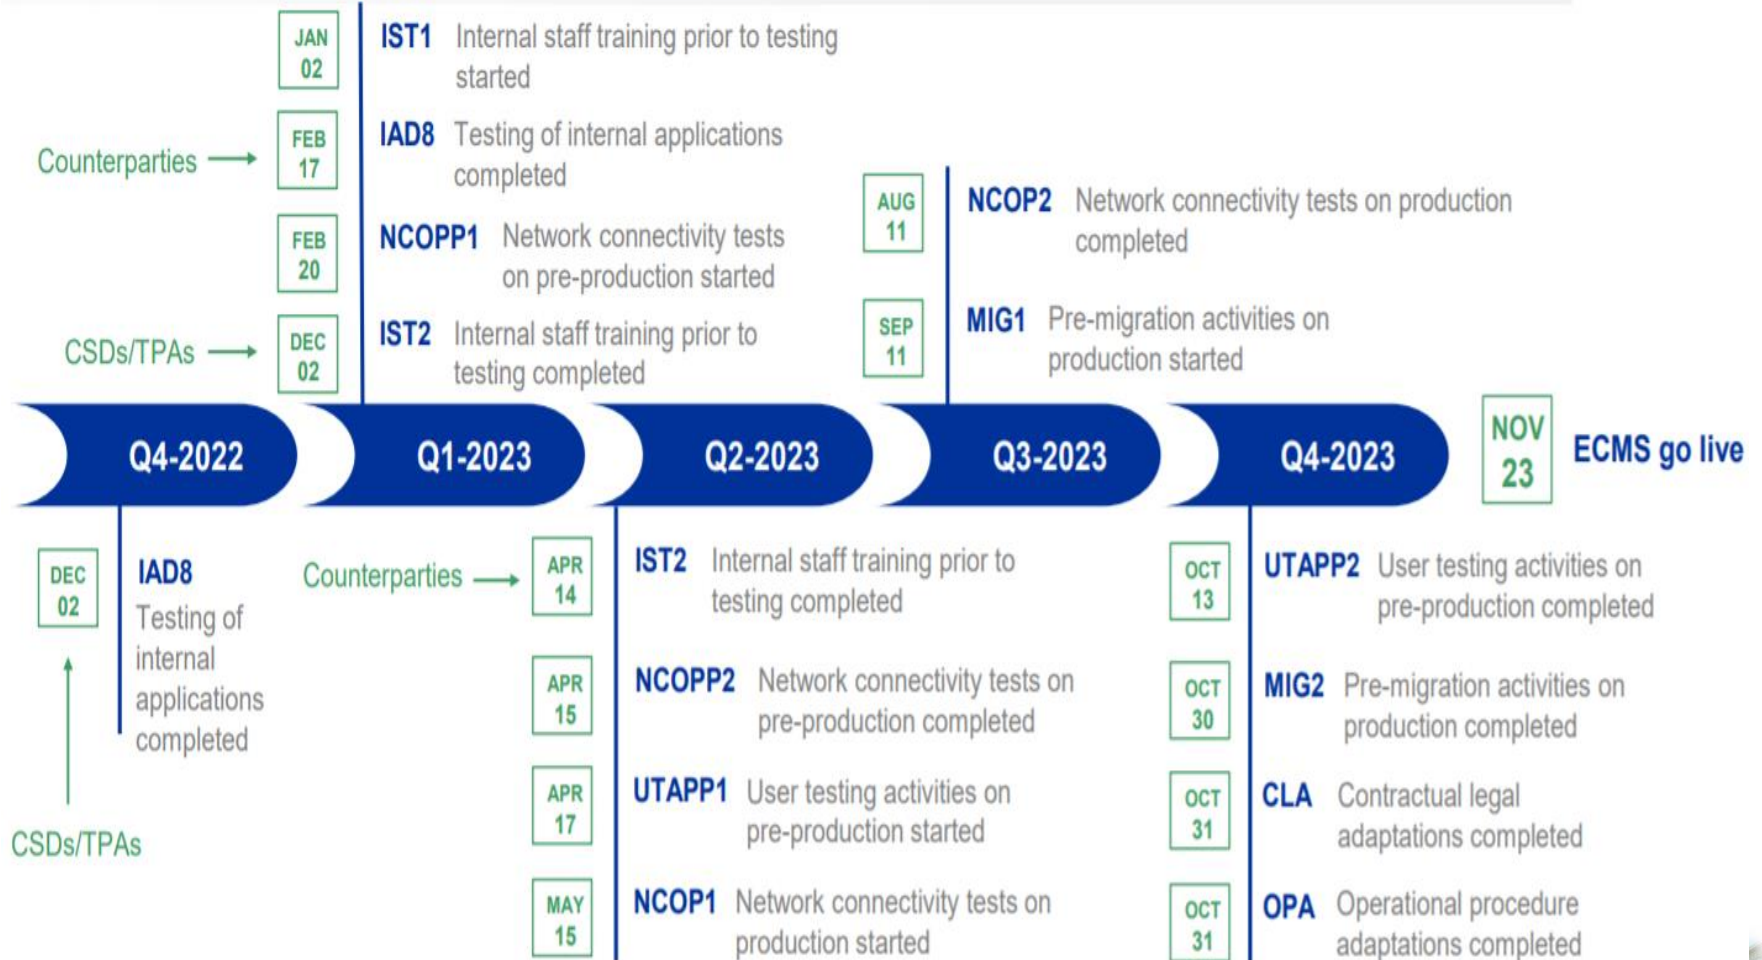

## Prossimo monitoraggio della readiness



NSP Network service provider procurement is completed

Actors have procured and signed a contract with their selected network service provider if not already done for the T2-T2S consolidation project.



IAD2 - Impact assessment is completed

Actors have completed the detailed business and technical impact assessment to adapt their IT systems and processes to the changing services of the ECMS. This includes the impact assessment on how to connect their IT systems to the ECMS.

- 3° monitoraggio readiness
- entro metà luglio: invio del questionari alle banche
- entro 8 agosto: restituzione del questionario compilato alla Banca d'Italia



## Documentazione ECMS

Deliverable	Timeline
Info pack on reports	mid June *
Package 1 Message guide Interim Catalogue of Message & Credit Claim Files Credit claim files/schemas List of U2A and A2A roles	mid June **
Package 2 Explainer on business configurations Explainer on DNs	end June
Package 3 Table of business rules Explainer on status codes	end June
Package 4 UDFS Addendum on Messages release note Catalogue of Message & Credit Claim Files Messages updated in MyStandards	end July

\* Posticipato a fine giugno

\*\* pubblicati il 15/6 al seguente link <https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/html/index.en.html>



**Grazie per  
l'attenzione**

